



REPORTE TRIMESTRAL TRANSPARENCIA

OCTUBRE- NOVIEMBRE –DICIEMBRE 2018

01 octubre 2018

Búsqueda de pieza con el soldador ocupando una flecha de acero inoxidable de $\frac{3}{4}$ con ganchos en la salida.

02 octubre 2018

trabajos realizados en el pozo 3^º2 para extraer la bomba con un diferencial de 3 toneladas y cable de acero quedando pendiente.

03 octubre 2018

- se continúan los trabajos en el pozo 3^º2 bajando un cable de acero y flecha de $\frac{3}{4}$ con ganchos en el pozo, estando la bomba a una profundidad de 37 metros.
- reparación de fuga en la calle mariano matamoros col. tulipanes, encontrando manguera averiada, ocupando el sig. material: 2 niples de espiga de $\frac{1}{2}$ pulgada de bronce, 4 abrazaderas sin fin de $\frac{3}{4}$ y 2 metros de manguera cedula 80 de $\frac{1}{2}$ pulgada y gas lp.

04 octubre 2018

- se tapa excavación realizada por toma domiciliaria y fugas en la calle Benito Juárez y Bernal diaz del castillo.
- verificación y ubicación de la red general para la conexión de una toma domiciliaria en el poblado de tlacuilolapán.



05 octubre 2018

se hace la conexión de toma domiciliaria en tlacuilolapán, del usuario isidro delgado, materiales: 6 metros de manguera C-80 de ½ pulgada, hidrotoma de 2 ½ pulgada, 3 abrazaderas sin fin de ¾, 2 conectores cuerda exterior de ½ pulgada de bronce, 65 cm de tubo de cobre de ½ pulgada, 2 codos cuerda interior soldable de ½ pulgada, llave jardinera de ½ pulgada, pasta silex, estaño, cinta teflón de ¾ y gas lp.

08 octubre 2018

- se realizan trabajos para extraer la bomba
- verificación de toma domiciliaria por no llegar agua

09 octubre 2018

verificación de fuga en la calle rosario castellano y Ricárdez Wilson quedando pendiente.

10 al 12 octubre 2018

trabajos en el pozo 3^a2 para extraer la bomba con un pescante de 6 pulgadas por 3 pulgadas, logrando rescatar la tubería y bomba el 12 octubre del 2018.

15 de octubre 2018

colocación de bomba de 25 hp con motor, quedando 16 tramos de tubería de 4", con una profundidad del pozo de 94 metros y nivel estático de 27.13 metros.



16 de octubre 2018

- reparación de fuga en san Lorenzo, manguera averiada en toma domiciliaria, ocupando el sig. material: 1 metro de manguera C80 de $\frac{1}{2}$ media pulgada, 2 niples de $\frac{1}{2}$ pulgada de bronce, 4 abrazaderas sin fin de $\frac{3}{4}$, gas lp.
- cancelación temporal de toma domiciliaria en san Lorenzo usuario: Felipe cordero, material: tapón galvanizado de cuerda exterior de $\frac{1}{2}$ pulgada, cinta teflón $\frac{3}{4}$.
- conexión de 2 tomas en la calle: miguel hidalgo, averiada por trabajos de pavimentación, materiales: 4 niples de espiga de $\frac{1}{2}$ pulgada de bronce, 8 abrazaderas sin fin de $\frac{3}{4}$, 10 metros de manguera C-80 de media, gas lp.

17 octubre 2018

reconexión de toma domiciliaria a nombre del usuario: ángel huerta en la colonia aviación, materiales: niple de $\frac{1}{2}$ pulgada de bronce, 3 abrazaderas sin fin de $\frac{3}{4}$.

suspensión de toma domiciliaria a nombre de marcial delgado en la red general, material: tapón galvanizado cuerda exterior de media pulgada y cinta teflón de $\frac{3}{4}$.

19 octubre 2018

trabajos realizados debido a fuga en la calle: rosario castellano, rompiendo concreto hidráulico, quedando pendiente.

22 octubre 2018

limpieza y desazolve de los registros de válvulas de 6 pulga en la calle constitución.



23 octubre 2018

Modificación de la red hidráulica de 2 pulgadas por trabajos realizados en la autopista en la colonia los manantiales, materiales: reducción campana de 2 ½ pulgada por 2 pulgadas galvanizada, "T" de 2" galvanizada, niple de 2", cinta teflón de ¾, gas lp, 4 conectores de 2" pulgadas galvanizado para manguera cuerda exterior, 15 metros de manguera de 2 pulgadas, 6 abrazaderas sin fin de 3".

24 octubre 2018

se realizan trabajos en pozo 3ª2 se extrae la bomba por fallas, con 16 tramos de tubería de 4", reparación de fugas de manguera averiada en la calle miguel hidalgo, materiales: 2 niples espiga de ½ pulgada de bronce y 4 abrazaderas sin finde ¾ y gas lp.

25 octubre 2018

colocación de la bomba del pozo 3ª2 en la colonia la bomba, con un diferencial de 3 toneladas, quedando 15 tramos de tubería, quedando pendiente por fallas.

26 octubre 2018

conexión de toma domiciliaria en san Lorenzo a nombre de Ana maría Mendoza morales, calle niño héroes esq. José maría Morelos, materiales: hidrotoma de 3"pulgadas, 6 metros de manguera C-80 de ½, 3 abrazaderas sin fin de 3/4, 2 conectores de cuerda exterior de ½ pulgada de bronce, 65 cm de tubería de cobre de ½ pulgada, 2 codos cuerda interior de ½ pulgada soldable, llave jardinera de ½ pulgada, pasta silex, estaño, gas lp, cinta teflón de 3/4 .



27 octubre 2018

se extraer la bomba del pozo 3^a2 cambiando motor, quedando con 15 tramos de tubería de 4" de fierro por 3 metros, motor y bomba de 25 hp, con profundidad de la bomba en 48.5 metros, profundidad del pozo 94 metros, nivel estático 29.5 metros.

29 de octubre 2018

- revisión y verificación de un encamisado de 6 pulgadas en nuevo Teapa para la modificación de la red hidráulica de 3" pulgadas.
- reconexión en tlacuilotapán en la calle rodríguez Malpica, usuario Nazario García olan, materiales: niple de ½ pulgada espiga de bronce, 4 abrazaderas sin fin de ¾, 2 metros de manguera de ½ pulgada C-80, 65 cm de tubería de cobre, 2 codos cuerda interior de ½ pulgada soldable, llave jardinera de ½ pulgada, conector cuerda exterior de ½ pulgada de bronce, gas lp, estaño, pasta silex y cinta teflón de ¾.

30 octubre 2018

trabajos de limpieza en el pozo 3^a1 y 3^a2, se traslada tubería de 3 pulgadas de 3x3 12 tramos a bodega y 3 tubería de 4" pulgadas.

31 octubre 2018

Toma domiciliaria en la colonia Cuichapa viejo en la granja de pollos, materiales: hidrotoma de ½ pulgada, 12 metros de manguera cedula 80 de ½, 2 conectores cuerda exterior espiga de ½ pulgada, 3 abrazaderas sin fin de ¾, gas lp, pasta silex, cinta teflón de ¾, 65 cm de tubería de cobre de ½ pulgada, 2 codos cuerda interior soldable de ½ pulgada y llave jardinera de ½ pulgada, rompiendo concreto hidráulico para la conexión de la toma.



NOVIEMBRE

01 noviembre 2018

Encamisado en el poblado de nuevo Teapa ocupando 4 tramos de tubería 6x6 metros.



02 noviembre 2018

se reparte agua de 1000 mil litros a usuarios de la colonia lázaro cárdenas debido al desabasto del vital líquido.

05 noviembre 2018

reparación en la calle: rosario castellano col. ejidal, hidrotoma y manguera averiadas, realizando modificación en la conexión, materiales. hidrotoma de 2 ½ pulgada, 15 metros de manguera C-80 de ½ pulgada, niple espiga de bronce de ½ pulgada, 4 abrazaderas sin fin de ¾.

06 noviembre 2018

se continúa los trabajos de encamisado en el poblado de de tres metros de tubería de 6 pulgadas.



se cancela en Cuichapa 2 tomas domiciliarias Hermelindo Sánchez diaz calle: José clemente Orozco segunda cerrada de Juárez col. comercial, toma suspendida manguera de $\frac{1}{2}$ pulgada, material: tapón galvanizado cuerda interior de $\frac{1}{2}$, conector cuerda exterior de espiga de $\frac{1}{2}$ de bronce, cinta teflón de $\frac{3}{4}$, 1 abrazadera sin fin de $\frac{3}{4}$.

Línea de agua suspendida en la manguera del Alfredo Luis Vázquez calle: diana Laura esq. Ricárdez Wilson col. ejidal, material: tapón galvanizado de $\frac{1}{2}$ pulgada cuerda interior, conector espiga cuerda exterior de $\frac{1}{2}$ pulgada, abrazadera sin $\frac{3}{4}$, cinta teflón de $\frac{3}{4}$ y gas lp.

se destapa toma domiciliaria por no llegar agua con presión el agua, en la colonia lázaro cadenas, material: gas lp y 2 abrazaderas sin fin de $\frac{3}{4}$.

se repara un bastón de $\frac{1}{2}$ pulgada de cobre averiado, en la toma domiciliaria del usuario francisco esteban calle: miguel hidalgo esq. lázaro cárdenas col. lazaro cárdenas, materiales: cople de $\frac{1}{2}$ pulgada soldable, gas lp, pasta silex, estaño.

07 noviembre 2018

se cubre con cemento parte del concreto hidráulico averiado la conexión de toma domiciliaria.

se comienz trabajos para toma domiciliaria en la calle venustiano carranza mario molina siendo cruce de calle quedando pendiente.



08 noviembre 2018

se continua la toma en la calle venustiano carranza mari molina colocando un encamisado de 2 ½ pulgada.



Reparación de fuga de manguera averiada en la calle: michoacana col. obrera, materiales. 2 abrazaderas sin fin de ¾, 1 niple de bronce de ½ y gas lp.

Revisión de 2 tomas domiciliarias por no llegar el agua en el callejón juan Escutia esq. los cocos col. nueva esperanza, materiales: gas lp, 2 niples de ½ pulgada y 6 abrazaderas s/f de ¾.

09 noviembre 2018

terminación de toma domiciliaria en el callejón Mario molina esq. Venustiano Carranza col. 18 de marzo, material: hidrotoma de 2 ½, 6 metros de manguera, 3 abrazaderas sin fin de ¾, 2 conectores de ½, 65 cm de tubo de cobre, 2 codos cuerda interior soldables, llave jardinera de ½ pulgada, cinta teflón de ¾, pasta silex, estaño y gas lp.



se destapa toma en la calle Benito Juárez col. comercial usuario: Marielena Guevara, material: 4 abrazaderas sin fin de $\frac{3}{4}$, 1 niple de $\frac{1}{2}$ pulgada y gas lp.

12 noviembre 2018

se cancela toma comercial del bama, en la calle Benito Juárez col. comercial, trabajo realizado en el basto de cobre de $\frac{1}{2}$ pulgada, colocando tapón galvanizado de $\frac{1}{2}$ pulgada.

Revisión de toma domiciliaria tapada en la calle Gutiérrez Zamora col. nueva esperanza, usuario: Cornelio García Domínguez, materiales: 5 abrazaderas sin fin de $\frac{3}{4}$, 1 niple de $\frac{1}{2}$ espiga y gas lp.

13 noviembre 2018



Verificación de toma domiciliaria en la calle: Bernal diaz del castillo, línea azolvada usuario: Raymundo canción, materiales: gas lp, niple de $\frac{1}{2}$ pulgada espiga y 4 abrazaderas sin fin de $\frac{3}{4}$.

Reparación de fuga en la calle Luis Pasteur en la colonia comercial, encontrado las hidrotoma averiadas, material: 2 hidrotoma de $\frac{1}{2}$ pulgada, 6 abrazaderas sin fin de $\frac{3}{4}$, gas lp y cinta teflón de $\frac{3}{4}$, 2 conectores cuerda exterior de bronce, 2 niples de $\frac{1}{2}$ pulgada y 2 metros de manguera c-80 de $\frac{1}{2}$ pulgada.



14, 15, 17 noviembre 2018

Limpieza del tanque de almacenamiento #2 en la colonia lázaro cárdenas quedando pendiente, se continua con la limpieza del tanque de almacenamiento #2, presentando lodillo y arena, quedando pendiente por falla para continuar con la limpieza, se concluye la limpieza del tanque de almacenamiento #2 de 300 mil litros ubicado en la calle miguel negrete esq. gutiérrez zamora.

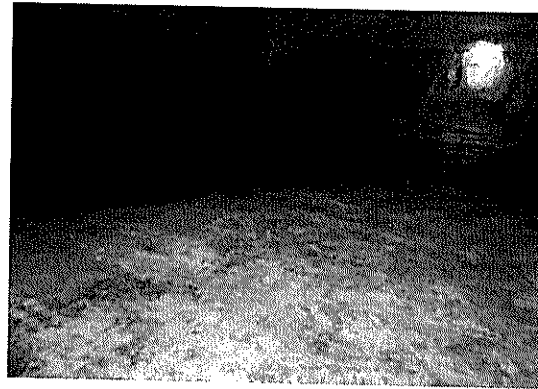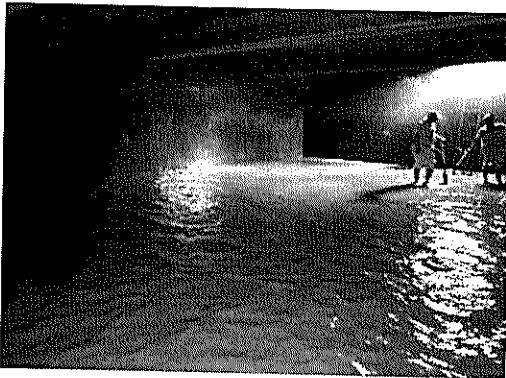

16 noviembre 2018

Limpieza de registro de aguas negras en la calle. michoacana col. obrera.

20 noviembre 2018

Reparación de fuga en manguera de 2 pulgadas en la calle: segunda cerrada de Juárez col. comercial, material: 2 abrazaderas sin fin de 2 pulgadas.

21 noviembre 2018

revisión de toma domiciliaria en la calle: Bernal diaz del castillo col. lázaro cárdenas, material: niple de $\frac{1}{2}$ pulgada espiga y 2 abrazaderas sin fin $\frac{3}{4}$.

22 noviembre 2018

Reconexión de la toma comercial del bama, material: codo de 90 grado de $\frac{1}{2}$ pulgada soldable, cople soldable de $\frac{1}{2}$ pulgada, 40 cm de tubería de cobre de $\frac{1}{2}$ pulgada, pasta silex, estaño, gas lp, cinta teflón de $\frac{3}{4}$.





Reparación de bastón de cobre de ½ pulgada en la calle miguel hidalgo, material: cople soldable de ½ y 20 cm de tubería de cobre de ½ pulgada, pasta silex, estaño y gas lp.

23 noviembre 2018

entrega de notificaciones a los usuarios por adeudo del servicio del agua.


24 noviembre 2018

se instalan 2 válvulas de 6" pulgadas en la calle benito Juárez col. comercial, material t de pvc de 6" pulgadas, 3 bridas espiga de 6" pulgadas.

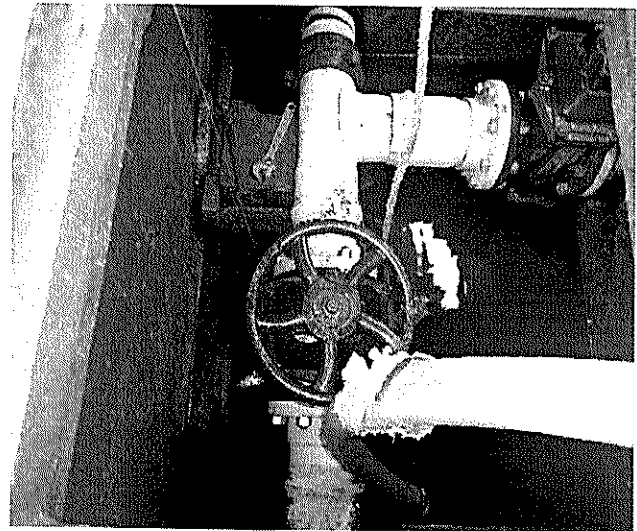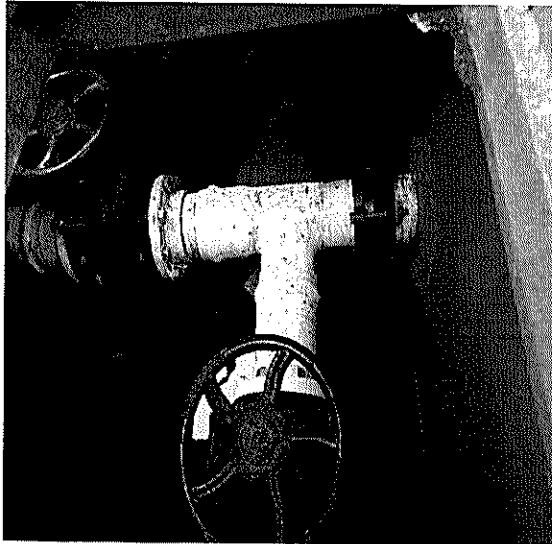

26 noviembre 2018



reparación de fuga en la calle luis pasteur, materiales: niple de ½ pulgada y 2 abrazaderas sin fin de ¾.

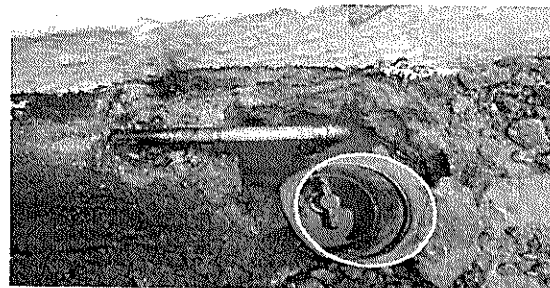




27 noviembre 2018

colocación de junta gibault en la calle benito juárez con sellos reforzados.

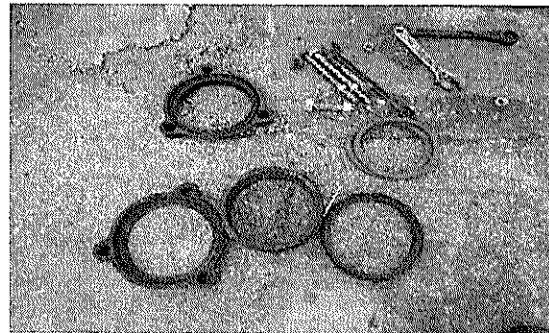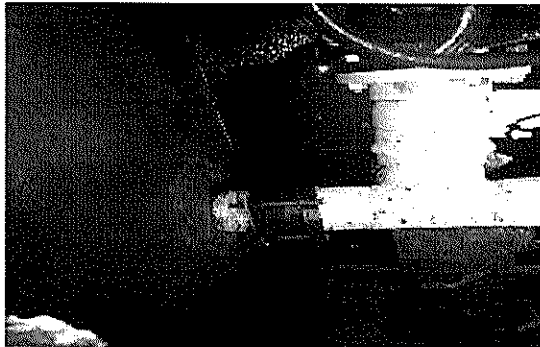

28 noviembre 2018

reubicación de toma domiciliaria por no llegar el agua, realizando la conexión en la línea de 6" pulgadas del pozo, usuario: raymundo cancino, material: hidrotoma de 6" pulgadas, conector cre espiga de 1/2 pulgada, niple de 1/2 pulgada, 5 abrazaderas sin fin de 3/4, 15 metros de manguera c80 de 1/2 pulgada.

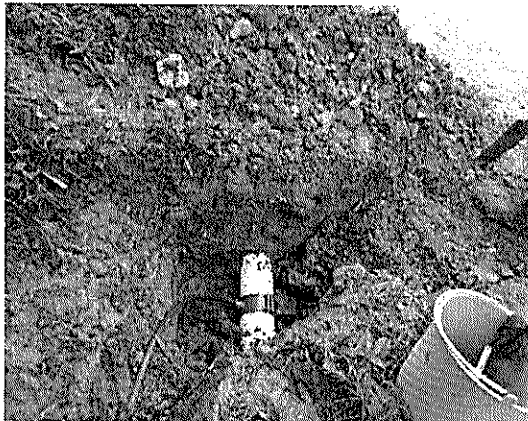

Reparación de fuga en la toma cancelada callejón José clemente Orozco col. comercial, materiales: tapón cuerda exterior galvanizado de 1/2 pulgada, cinta teflón de 3/4 .



29 noviembre 2018

conexión de toma domiciliaria en tlacuilotapán calle: francisco i madero, material: hidrotoma de 3 pulgadas, 12 metros de manguera cedula 80 de ½ pulgada, bastón de ½ pulgada, 65 cm de tubería de cobre, 2 codos cuerda interior soldables, llave jardinera de ½ pulgada, 2 conectores, cuerda exterior de ½ pulgada, 3 abrazaderas sin fin de ¾.

30 noviembre 2018


Reparación de 4 fugas callejón: constitución col. agraria se cambia hidrotoma de 2 ½ pulgada y abrazadera sin fin de ¾. calle constitución col. agraria, se cambia 1 hidrotoma de 2 ½ pulgada y abrazadera sin fin. calle miguel hidalgo col.comercial, material 4 metros de manguera c-80, 2 niple de ½ pulgada y 4 abrazaderas sin fin de ¾. calle Cuauhtémoc col. el macayo, manguera averiada material: 2 niples de ½ pulgada y 4 abrazaderas sin fin y 1 metro de manguera de ½ pulgada.



DICIEMBRE

01 diciembre 2018

limpieza del tanque 1 de almacenamiento con capacidad de 400 mil litros en la calle benito Juárez col. militar.

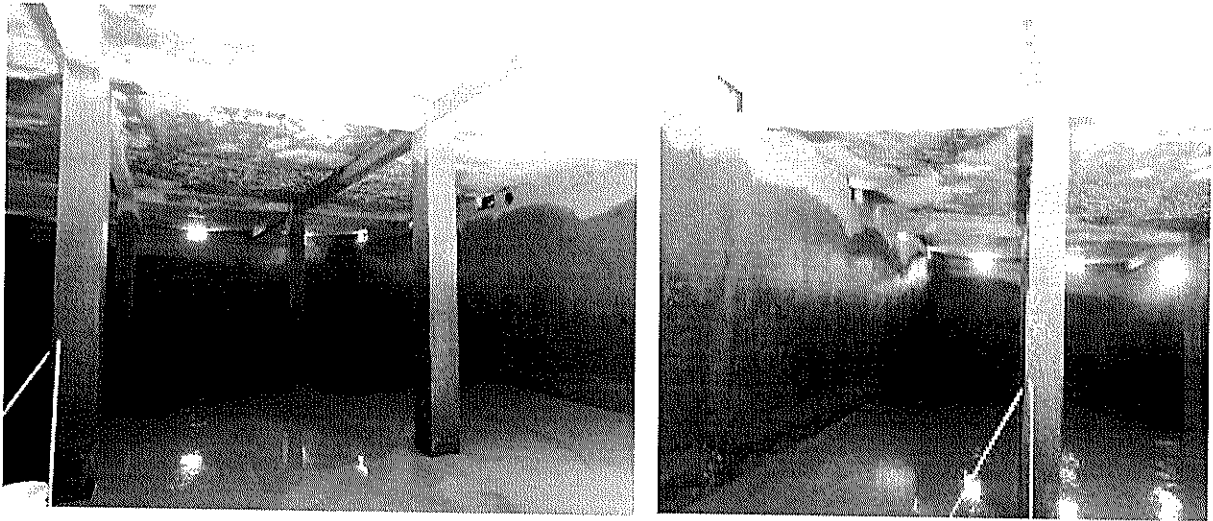

03 diciembre 2018

se realiza toma domiciliaria en la calle 20 de noviembre ubicando la red general.

04 diciembre 2018

modificación de la red general de 2" pulgadas en la colonia los manantiales poblado de nuevo Teapa, material: manguera de 2" pulgadas 30 metros, conectores, 3 hidrotoma de 3" pulgadas, 10 metros de manguera de ½.

05 diciembre 2018

reparación de fuga en la calle mario molina, material: 2 niples de ½ pulgada, 4 abrazaderas sin fin de ¾.



Reparación de fuga en la calle Juárez col. Cuichapa vieja manguera averiada, material:1 niple de $\frac{1}{2}$ pulgada y 2 abrazaderas sin fin de $\frac{3}{4}$.

06 de diciembre 2018

modificación de red general en el poblado de nuevo teapa, por trabajos realizado de caminos y puentes, materiales: 2 hidrotoma de 3 pulgada, 2 hidrotoma de 2", 15 abrazaderas sin fin de $\frac{3}{4}$, conector cuerda exterior de 2 $\frac{1}{2}$ pulgada para cementar, cople de 2 pulgadas, gas lp, cinta teflón de $\frac{3}{4}$, 4 niples de $\frac{1}{2}$ pulgada.

07 diciembre 2018

se termina toma domiciliaria en tacomango, usuario: domingo mendoza morales, material: 6 metros de manguera cedula 80 de $\frac{1}{2}$ pulgada, hidrotoma de 2 $\frac{1}{2}$ pulgada, 4 abrazaderas sin fin de $\frac{3}{4}$, 2 conectores cuerda exterior de $\frac{1}{2}$ pulgada, 65 cm de tubo de cobre de $\frac{1}{2}$ pulgada, gas lp, pasta silex, estaño, cinta teflon de $\frac{3}{4}$, llave jardinera de $\frac{1}{2}$ pulgada, 2 codos cuerda exterior de $\frac{1}{2}$ pulgada.





08 diciembre 2018

reparación de fuga en moloacán en la línea de conducción al tanque del cárcamo de 4 pulgadas de PVC, materiales, media extremidad campana de 4 pulgadas, 4 metros de tubería de 4 pulgadas, tornillería de 5 octavos.

10 diciembre 2018

verificación de fuga en la calle: Venustiano Carranza col. 18 de marzo quedando pendiente, Limpieza del área del pozo 3^a1 y 3^a2.

11 diciembre 2018

Limpieza de los tinacos en la cabecera municipal y verificación de líneas de distribución y revisando conexiones en el interior del palacio.

Reparación de una fuga en la calle: 2 abril col. obrera, línea de PVC averiada, materiales. coples de reparación de 2 ½ pulgada, 1 metro de tubo de ½, niple de ½ pulgada, hidrotoma de 2 ½ pulgada, 3 abrazaderas sin fin de ¾.

12 diciembre 2018

Modificación de la red general de 2 ½ pulgada por deslave de un cerro, materiales. 5 metros de manguera C-80 de media pulgada, 6 abrazaderas sin fin de ¾, 3niples de ½ pulgada.

13 y 14 diciembre 2018

mantenimiento del 3^a1 ,3^a2 ,3c, 3d, 3e ubicados en villa Cuichapa, mantenimiento con pintura y limpieza de maleza.

Reparación de fuga en Cuichapa viejo calle Benito Juárez, bastón de ½ pulgada de cobre averiado, material: 65 cm tubería de cobre, pasta silex, estaño, gas lp, 4 abrazaderas sin fin ¾, 2 metros de manguera de ½ pulgada.



17 diciembre 2018

Conexión en el salón de usos múltiples en el área de los sanitarios y limpieza del tinaco de 1100 litros, reparación de fuga en manguera, material: 2 niples de $\frac{1}{2}$ pulgada de $\frac{3}{4}$, 4 abrazaderas sin fin de $\frac{3}{4}$ y 2 metros de manguera c-80 de $\frac{1}{2}$ pulgada.

Reparación de fuga en la calle Benito Juárez col. comercial, material: 2 metros de manguera C-80 de $\frac{1}{2}$, 1 niple de $\frac{1}{2}$ pulgada de bronce, 4 abrazaderas sin fin de $\frac{3}{4}$.

18 diciembre 2018

Reparación de fuga en la calle: Venustiano Carranza, hidrotoma averiada de 2 $\frac{1}{2}$ pulgada, 3 abrazaderas sin fin de $\frac{3}{4}$.

cambio de herrajes en los sanitarios del salón de usos múltiples y conexiones de PVC de $\frac{3}{4}$ en un tinaco de 1100.

Reparación de fuga en la calle Andrés flores cruz, manguera averiada, materiales, niple de bronce de $\frac{1}{2}$ pulgada.

19 diciembre 2018

Toma domiciliaria nueva en la calle corregidora, materiales 6 metros de manguera C-80, hidrotoma de 2 $\frac{1}{2}$ pulgada, 4 abrazaderas sin fin de $\frac{3}{4}$, 2 conectores cuerda exterior de $\frac{1}{2}$ pulgada, 65 cm de tubería, 2 codos cre soldables, 5 abrazaderas sin fin de $\frac{3}{4}$, llave jardinera de $\frac{1}{2}$ pulgada, pasta silex, estaño y gas lp, cinta teflón de $\frac{3}{4}$.



Reparación de Fuga en la calle mariano matamoros col. tulipanes, material: 4 abrazaderas sin fin de $\frac{3}{4}$ y 2 niples de $\frac{1}{2}$ pulgada.

Reparación de bastón en la agencia de tlacuilolapán, materiales: codo soldable de $\frac{1}{2}$ pulgada, conector soldable cuerda interior de $\frac{1}{2}$ pulgada, llave jardinera de $\frac{1}{2}$ pulgada, pasta silex, estaño y gas lp.

20 diciembre 2018

se verifica toma domiciliaria en santa Cecilia por estar tapada revisando hasta la hidrotoma, materiales: 2 niples de $\frac{1}{2}$ pulgada, 6 abrazaderas sin fin de $\frac{3}{4}$.

21 diciembre 2018

Reconexión de toma domiciliaria del usuario: Javier Domínguez, calle Hermenegildo galeana col. tulipanes, material: hidrotoma de 2 $\frac{1}{2}$ pulgada, conector cuerda exterior de $\frac{1}{2}$ pulgada, cinta teflón de $\frac{3}{4}$, 2 abrazaderas sin fin de $\frac{3}{4}$.

Desazolve de registro de aguas negras ubicado: en la calle Benito Juárez esq. Álvaro obregón, materiales.

24 diciembre 2018

Reparación de fuga hasta hidrotoma en el kilómetro 39, materiales: 4 abrazaderas sin fin $\frac{3}{4}$, 1 metro de manguera cedula 80.

Reparación de fuga en la calle venustiano carranza calle: 18 de marzo, material: 3 hidrotoma de 2 $\frac{1}{2}$ pulgada, 4 niples de $\frac{1}{2}$ pulgada, 12 abrazaderas sin fin de $\frac{3}{4}$, 5 metros de manguera cedula 80 y 8 metros de manguera kitec.



26 diciembre 2018

Reparación de fuga en la calle corregidora, material: tapón campana de 2 ½ pulgada, 5 hidrotoma de 2 ½, 3 abrazaderas sin fin de ¾, cinta teflón de ¾, gas lp, 4 niples de ½ pulgada.

Desazolve de drenaje, se rompe concreto hidráulico en la calle Álvaro obregón por un drenaje de aguas negras tapado.

27 diciembre 2018

se continua el registro de aguas negras quedando destapado el drenaje en la calle Álvaro obregón. Se hace el levantamiento del material de la excavación realizada en la calle. corregidora colocando material arenoso

conexión domiciliaria en la calle corregidora #2, material: hidrotoma de 2 ½ pulgada, 10 metros de manguera C-80, 2 conectores cuerda exterior de ½, 65 cm de tubo de cobre, 2 codos cuerda interior soldable, llave jardinera de ½ pulgada, cinta teflón de ¾, 3 abrazaderas sin fin de ¾, pasta silex y gas lp.

28 diciembre 2018

levantamiento del material dañado por la excavación de la calle Álvaro obregón debido a la reparación del drenaje de aguas negras colocando material arenoso.

31 diciembre 2018

- Reconexión del usuario Juana Hernández Sánchez calle pino Suarez #14 interior en la colonia aviación, material 6 metros de manguera cedula 80 de media pulgada, 5 abrazaderas sin fin de ¾, 65 cm de tubería de cobre de ½, 2 codos cuerda interior soldable, 2 conectores cuerda exterior de bronce, llave jardinera de ½ pulgada, cinta teflón de ¾, pasta silex, estaño y gas lp.
- se tapa con material arenoso la excavación realizada por la reconexión del sr. Javier Domínguez, en la calle galeana col. tulipanes.
