



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (JMAPS)


REPORTE TRIMESTRAL TRANSPARENCIA JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018



JULIO



2 julio 2018

Terminación de toma domiciliaria a nombre de ramón Hernández morales, colonia lázaro cárdenas. Materiales: Hidrotoma de 2 ½ pulgada, 6 metros de C-80 de ½ pulgada, 3 abrazaderas sin fin ¾, bastón de ½ pulgada, cinta teflón de ¾, bastón de 2 ½ pulgada (2 codos cuerda exterior ½", 65 cm de tubería de cobre, 2 conectores cuerda exterior de espiga de 1/2 pulgada, llave jardinera de ½ pulgada, pasta sílex, estaño y gas lp.

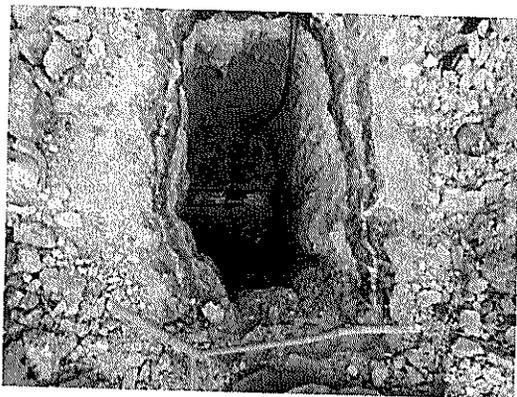

03 julio 2018



Colocación de bomba completa con motor en san Martín tipo franklin de 5 hp, con salida de 2 pulgadas siendo 8 tramos de tubería de 2 pulgadas por 6 metros de longitud.

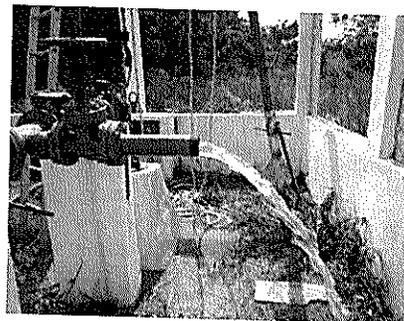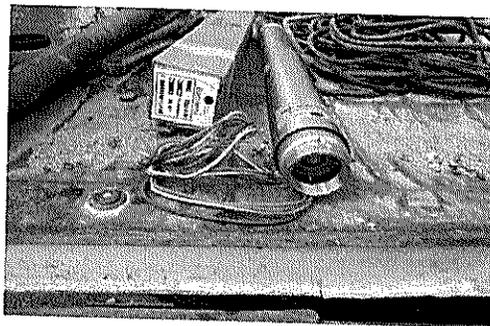



04 julio 2018

Se continúa los trabajos en el pozo de san Martín por presentar arena.

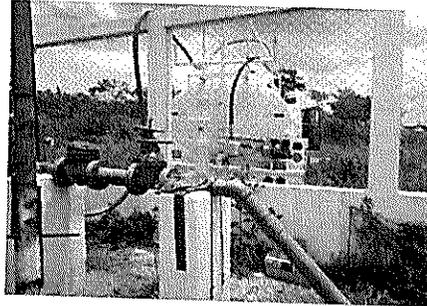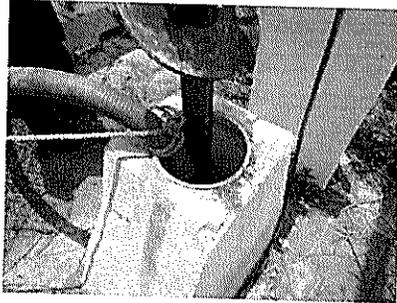

05 julio 2018


- Se extrae en el pozo de san Martín los tramos de tubería de fierro de 2 pulgadas, quedando el pozo con 7 tramos de 6 metros de 45cm de 2" pulgadas de fierro galvanizado, con fondo de la bomba a 56 metros de 80 de profundidad.
- Limpieza del tanque de almacenamiento de san Martín de capacidad de 50 mil litros, presentando sedimento y arena.





06 julio 2018


- Reparación de fugas en san Martín, mangueras kitec averiadas de $\frac{1}{2}$ pulgadas. materiales: 14 abrazaderas sin fin $\frac{3}{4}$, 10 metros de manguera cedula 80 de $\frac{1}{2}$, gas lp.

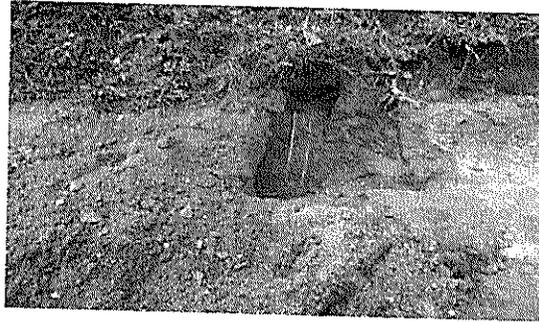

- Reparación de fuga en tlaquilolapán en la calle primero de mayo, reparación de manguera de media pulgada averiada, materiales: 1 metro de manguera cedula 80, 4 abrazaderas sin fin $\frac{3}{4}$, 2 niples de bronce de $\frac{1}{2}$ pulgada y gas lp.


08 julio 2018

- colocación de bastón de una toma domiciliar realizada con anterioridad en la calle Ricárdez Wilson col. ejidal a nombre de Pedro Luis Hernández. materiales: 2 codos soldables cuerda interior de $\frac{1}{2}$ pulgada, conector cuerda exterior de bronce de $\frac{1}{2}$ pulgada, 65 cm tubería de cobre de $\frac{1}{2}$ pulgada, 1 llave jardinera de $\frac{1}{2}$ pulgada roscable, cinta teflón de $\frac{3}{4}$, gas lp, estaño pasta silex, 2 abrazaderas sin fin $\frac{3}{4}$.

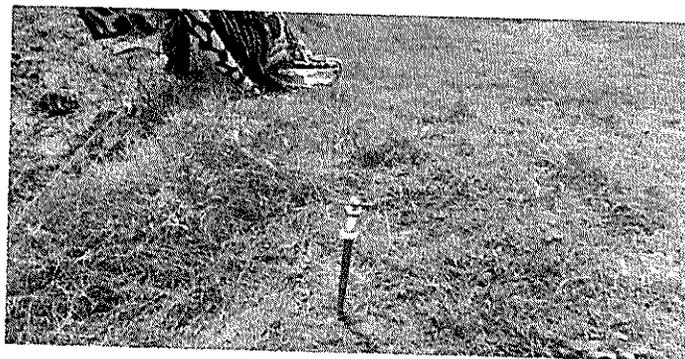




- Reconexión de toma domiciliar a nombre de Dominga ramos Chávez calle. José maría pino Suarez col. Comercial, material: 8 metros de manguera cedula 80 de ½ pulgada, 2 niples de ½ de bronce, 4 abrazaderas sin fin de ¾, cinta teflón de ¾ y gas lp.

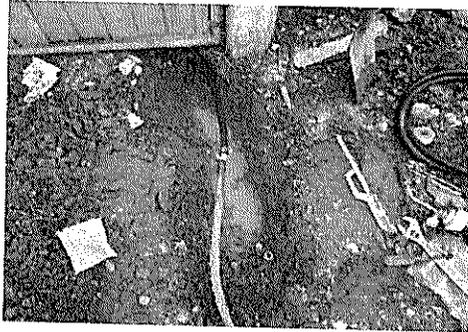

09 julio 2018

- Reconexión en tlacuilolapán en la calle francisco I madero a nombre de simón Urbina Hernández, material: 65 cm de tubería de cobre de media pulgada, 2 codos cuerda interior soldable de ½ pulgada, 1 llave jardinera de 1/2, conector cuerda exterior espiga de ½, 2 abrazaderas sin fin de 3/4, gas lp, pasta silex, estaño y cinta teflón de ¾.

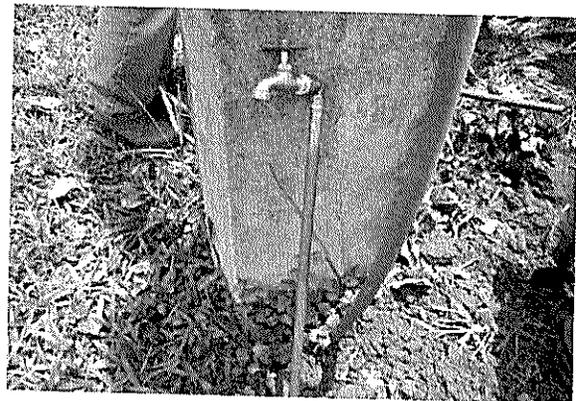




- se repara fuga en la calle francisco I madero manguera cedula 80 de ½ pulgada averiada. materiales: 2 niples de espiga de ½ pulgada de bronce, 4 abrazaderas sin fin de ¾, 1 metro de manguera C-80 de media pulgada, gas lp.



10 julio 2018. -Toma domiciliaria en san Lorenzo en la calle Benito Juárez, quedando pendiente por no ubicar la red hidráulica.


11 julio 2018

- terminación de toma domiciliaria en san Lorenzo a nombre de francisco ruiz cruz. Materiales: Hidrotoma de 3 pulgadas, 6 metros de manguera cedula 80 de ½", 3 abrazaderas sin fin de ¾, 2 conectores cuerda exterior de media pulgada, 65 cm de tubería de cobre, 2 codos cuerda interior soldable, 1 llave jardinera de ½, gas lp, pasta silex y estaño.

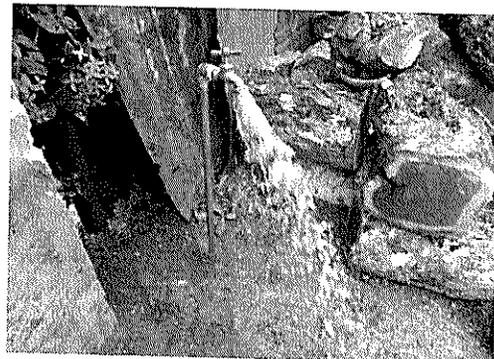




- Se realiza tomas nuevas en la calle insurgentes col. aviación rompiendo parte de concreto hidráulico, quedando pendiente por terminar cruce de calle.

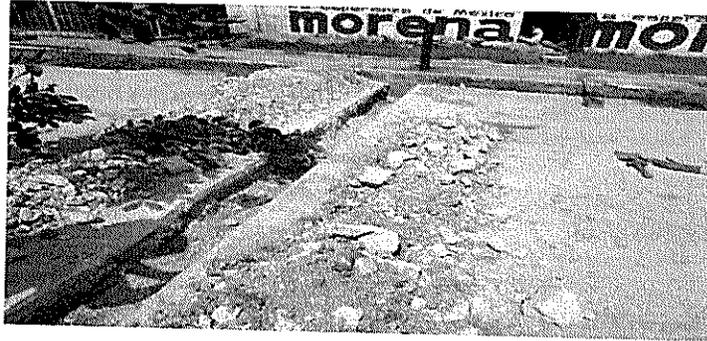

12 julio 2018


- Se continua los trabajos en la calle insurgentes col. aviación, terminando de romper el cruce de la calle y colocando un encamisado de tubería de 2 ½" pulgada de PVC de 12 metros, para la colocación de 3 tomas domiciliarias.

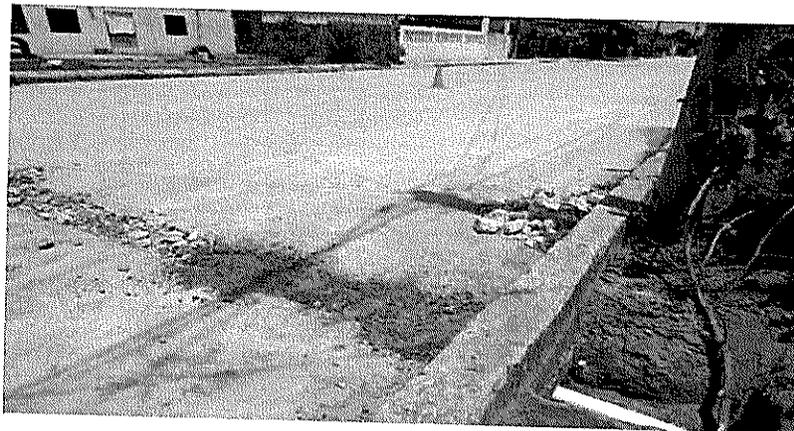



13 julio 2018

- Se termina los trabajos en la colonia aviación, realizando la conexión de 3 tomas domiciliarias. materiales: 3 Hidrotoma de 2 ½ pulgada, 42 metros de manguera cedula 80, tres conectores cuerda exterior de ½ pulgada de bronce, 10 abrazaderas sin fin ¾, 3 tapones cuerda exterior galvanizado de ½ pulgada, 3 conectores cuerda interior de espiga de media pulgada, cinta teflón de ¾ y gas lp. se tapa con cemento parte del concreto hidráulico averiado.

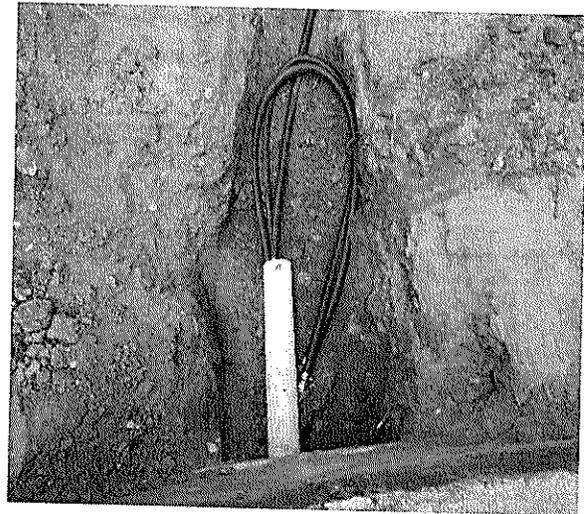

- Revisión de fuga en la calle francisco Javier mina col. Militar, rompiendo el concreto hidráulico para su verificación, conexión de toma del usuario Felipe de Jesús lagunas Brito, quedando pendiente y acordonado el área.



16 julio 2018



- se repara fuga en la calle francisco Javier mina y se rompe concreto hidráulico y parte de la banquetta encontrando la manguera averiada, Materiales: 8 metros de manguera cedula 80 ½ pulgada, 2 niples de espiga de ½ pulgada, 12 abrazaderas sin fin de ¾, se tapa con cemento la parte afectada por concepto de una fuga en el concreto hidráulico en la calle francisco Javier mina colonia militar.



- Limpieza del área del pozo 3D de maleza y basura, ubicado entre la calle Juárez y Bernal Díaz del castillo.

17 julio 2018


Desazolve de dos registros de aguas negras en la calle Zósimo Pérez, Luis Donaldo Colosio y rosario castellanos de la colonia ejidal.

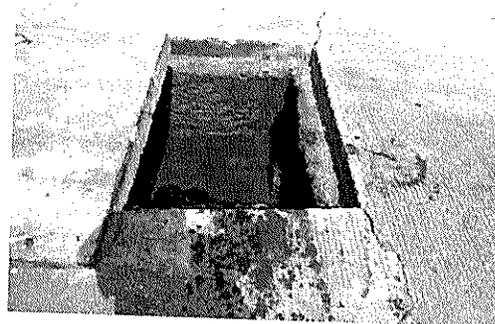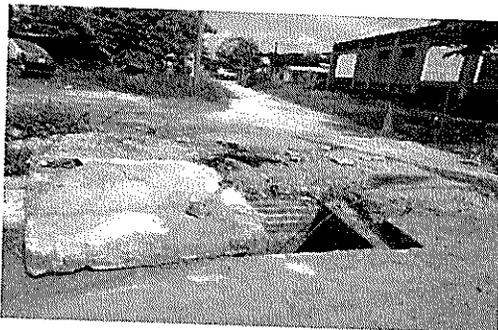



18-19 julio 2018

Limpieza de basura y maleza, mantenimiento de pintura en el área de los pozos 3^a1 y 3^a2 de la calle francisco Sarabia col. la bomba.

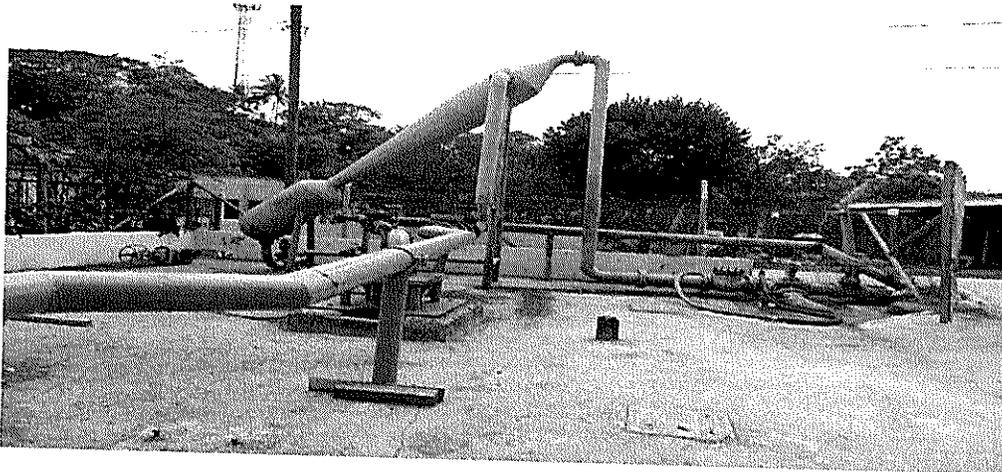

19 julio 2018


- se continúan con las labores en el pozo 3^a1 y 3^a2 mantenimiento de las instalaciones.
- se levanta material de una toma en la calle insurgentes col. aviación.
- reparación de fuga en la calle mariano matamoros col. Tulipanes, encontrando las mangueras de ½ pulgada averiadas, materiales: 2 niples de espiga de ½ pulgada de bronce, 4 abrazaderas sin fin ¾, 4 metros de manguera C-80 de ½ pulgada y gas lp.





20 julio 2018

- Se colocan tapones galvanizados en la tubería de fierro de 3" pulgadas que cruza el puente joroba en la segunda cerrada de Juárez, Material:2 tapones galvanizados de 3" pulgadas.

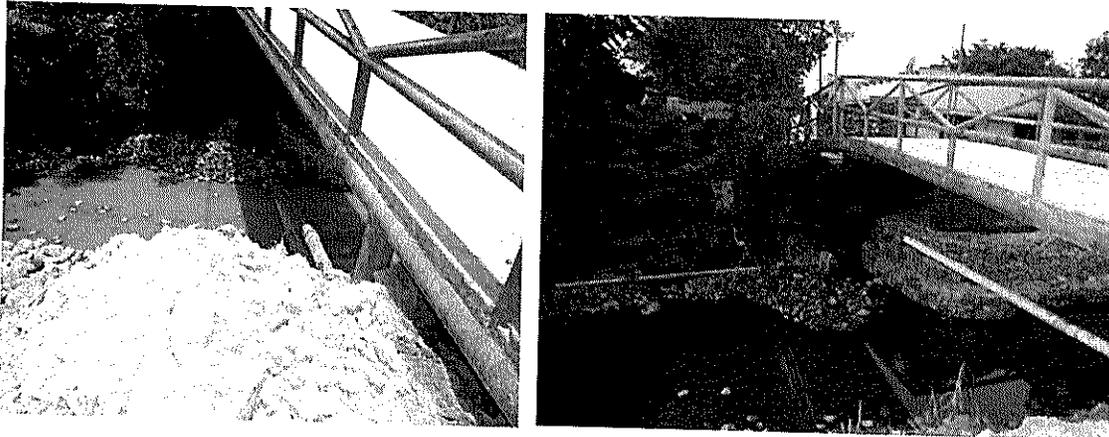

- Desazolve de registro de válvula de 2 ½ pulgada en la calle Zósimo Pérez esquina Octavio paz de la colonia ejidal.




- se tapa con cemento la otra parte pendiente de la toma domiciliaria en la calle insurgentes de la colonia aviación.



23 julio 2018

Reparación de fuga en santa Cecilia, tubería de 2 ½ pulgada averiada, materiales:
1 niple de PVC hidráulico RD 26, 1.50 metros de manguera, 1 cople de reparación
de 2 ½ pulgada.

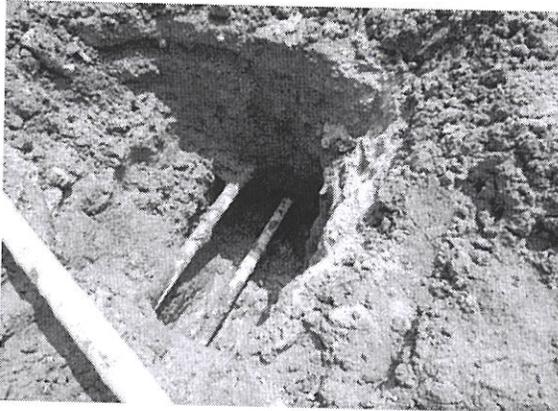

24 julio 2018

Reparación de fugas en san Martín encontrando mangueras averiadas, material: 2
metros de manguera Cedula 80 de ½ pulgada, 4 abrazaderas sin fin de ¾.






25 julio 2018

- Se traslada tripie de tubería de 3 pulgadas reforzado para transportarlo al pozo 3^a2 para su mantenimiento.
- Reparación de fuga en Moloacán siendo manguera averiada de ½ pulgada, material: 2 niples de bronce espiga de ½, 4 abrazaderas sin fin de ¾.


26 julio 2018

- Se coloca tubería en el pozo 3^a2 por quedarse sin agua la bomba, colocando 2 tramos de tubería de 3 metros de 4 pulgadas quedando en 16 tramos de tubería más la bomba.

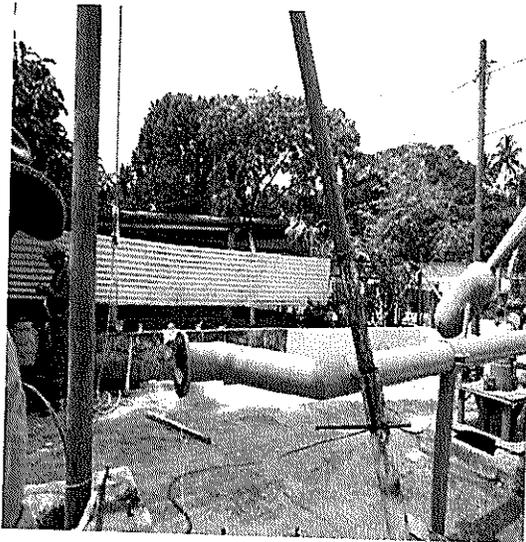





- Conexión en el puente joroba en la calle segunda cerrada de Juárez interior de la col. Ejidal, sin servicio sector por averiarse la línea de fierro de 3 pulgadas; materiales: manguera de 2 pulgadas 10 metros, 2 coples de PVC hidráulico, 10 abrazaderas de ½ pulgada, 2 conectores galvanizados de 2 pulgadas de espiga cuerda exterior, 1 reducción bushing de 3 por 2 pulgadas galvanizada, reducción campana de 3 pulgadas por 2 galvanizada, cinta teflón de ¾, gas lp.

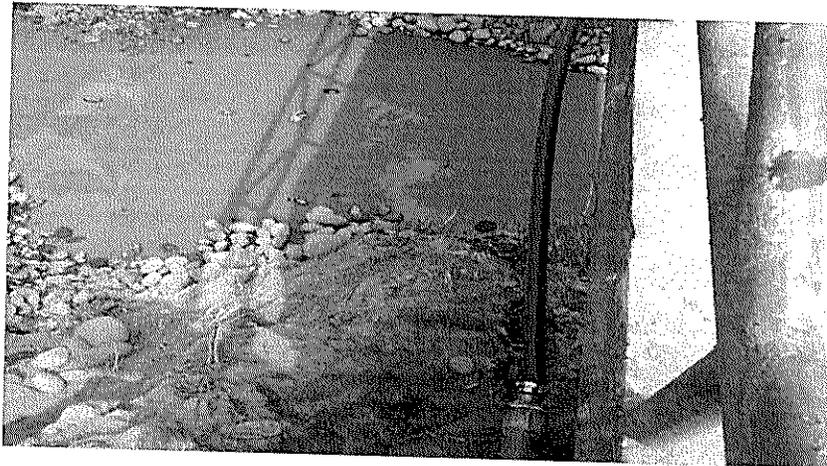

27 julio 2018


Limpieza y mantenimiento en el área del pozo 3e ubicado en la calle Bernal diaz del castillo, limpieza de maleza y basura.

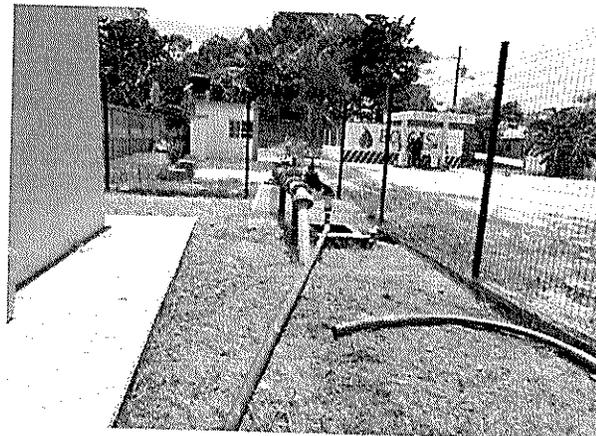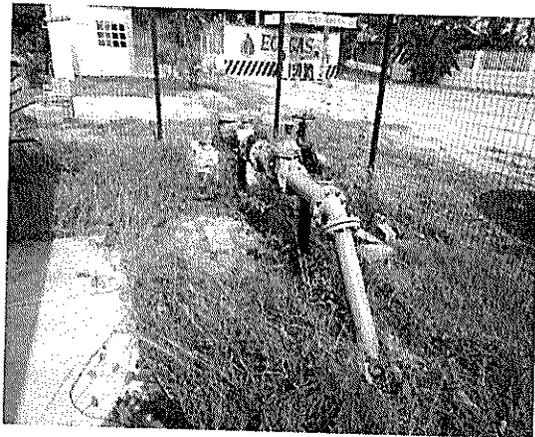




30 julio 2018

- Limpieza en el pozo 3d ubicada en la calle Juárez col. lázaro cárdenas.
- revisión y mantenimiento de válvula por encontrarse calzada, desarmando el preñe y parte de la tornillería colocando cordón grafitado ubicado en la calle Bernal diaz del castillo esquina lirios.

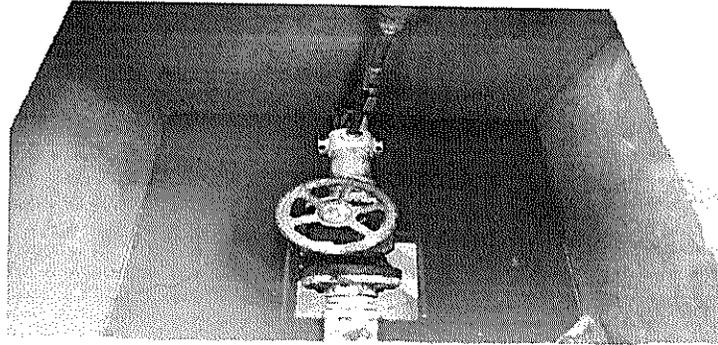

- reparación de bastón averiado en la calle constitución colonia comercial, Material: 3 abrazaderas sin fin $\frac{3}{4}$, 2 metros $\frac{1}{2}$ de manguera cedula 80 de $\frac{1}{2}$ pulgada conector cri de $\frac{1}{2}$.

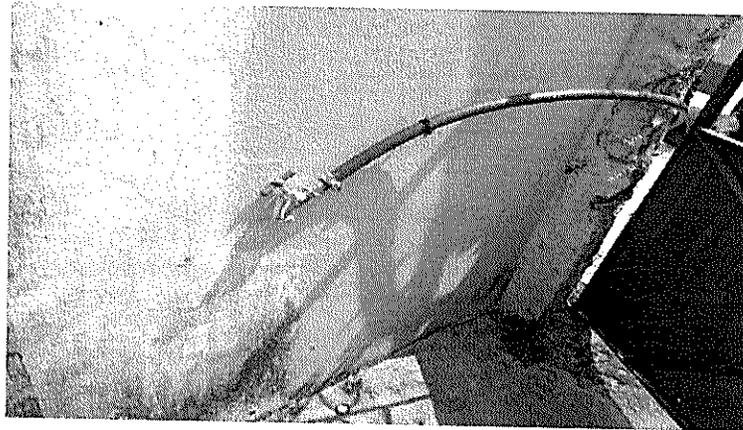



31 julio 2018

- Revisión de toma domiciliaria en la calle Galeana por no llegar el agua, presentando sedimento y lodillo en la conexión del bastón y la manguera, a nombre de Rodolfo Vargas en la colonia tulipanes, material: niple de espiga de $\frac{1}{2}$ pulgada de bronce, 2 abrazaderas sin fin $\frac{3}{4}$, gas lp.







AGOSTO

1 agosto 2018

- válvula de 8" en la calle Benito Juárez por las escaleras del tanque, cambiando la tornillería.

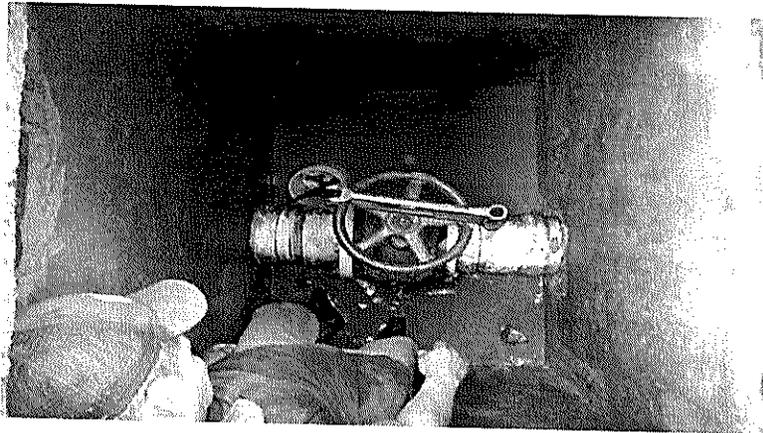



- se destapa toma domiciliaria en la calle Manuel acuña col. Iázaró Cárdenas encontrando sedimento y lodillo, materiales: gas lp, 8 metros de manguera c-80 ½ pulgada, 4 abrazaderas in fin de ¾, niple espiga de ½ pulgada de bronce.

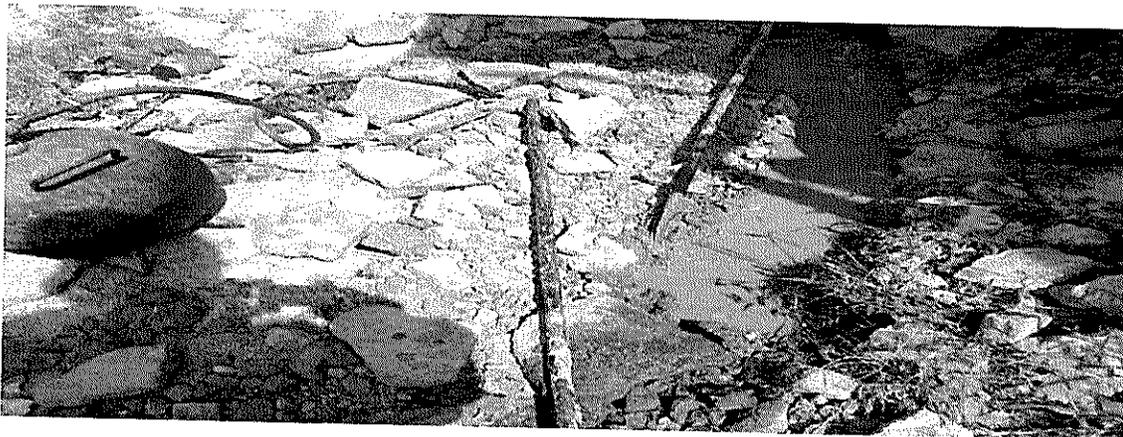



02 agosto 2018

se cambia la válvula pendiente de 8 pulgadas de compuerta de fierro en un registro ubicada en la calle Juárez.

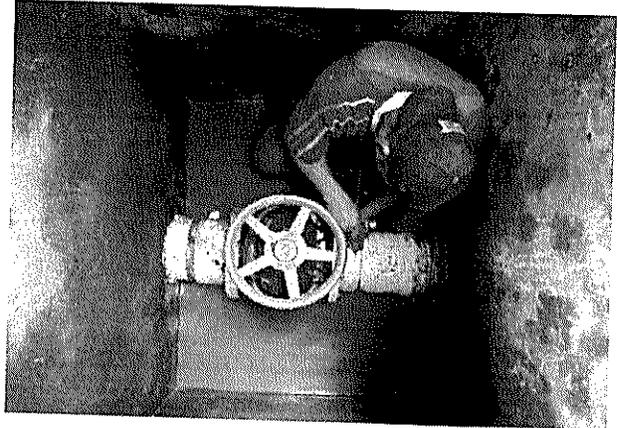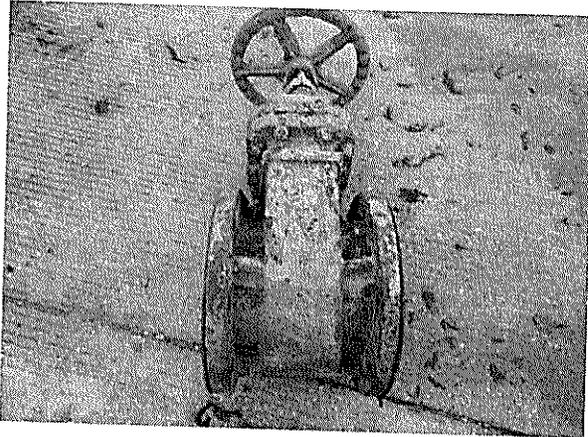

03 agosto 2018

Reparación de fuga en un juego de válvulas que suministra el agua a la factoría de Pemex, material: 1 niple de PVC de espiga de 2" pulgadas, 2 abrazaderas sin fin de 2 ½ pulgada, y 6 abrazaderas sin fin de ¾.

04 agosto 2018

se repara fuga en la red ubicada en la calle Benito Juárez y Venustiano Carranza tubería averiada de 3" pulgadas, material: 1 cople de reparación de 3" de PVC hidráulico.

05 agosto 2018

Reparación de fuga en bastón ocupando los sig. materiales llave jardinera de ½ pulgada, 2 codos cuerda interior soldables, 65 cm de tubería de cobre de ½ pulgada, conector espiga cuerda exterior de ½ pulgada, gas lp, estaño y pasta silex.



06 agosto 2018

reparación de fuga y colocación de 2 tomas domiciliarias en santa Cecilia ocupando los siguientes materiales 12 metros de manguera cedula 80 de ½ pulgada, 2 Hidrotoma de ½ pulgada, 3 conectores cuerda exterior de ½ pulgada, 8 abrazaderas sin fin de ¾, 1 niple espiga de ½ pulgada, 1 niple galvanizado de 90 cm, 2 codos cuerda interior galvanizado de media pulgada y llave jardinera de ½.

07 agosto 2018

revisión y desazolve de 2 registros de válvulas ubicado en la calle Bernal diaz del castillo esquina lirios y en la calle galeana esq. Benito Juárez, revisando tornillo y cordón grafitado.

se repara fuga en manguera en la calle lázaro cárdenas col. comercial, material: niple espiga de ½ pulgada y 2 abrazaderas sin fin de ¾.

08-agosto 2018

Nuevo Teapa

- trabajo de limpieza en el área del pozo maleza y basura
- fuga en la calle galeana en la col. tulipanes rompiendo parte del concreto hidráulico localizando la conexión de toma domiciliaria quedando pendiente por no haber agua.

09 agosto 2018

- se continúan los trabajos en la calle galeana, se procede rompiendo parte del concreto hidráulico, siendo la red general de 2 ½ pulgada de PVC averiada, materiales: 1 metro de tubería de 2 ½ pulgada, 1 cople de reparación de ½ pulgada, 1 Hidrotoma de 2 ½ pulgada, 4 metros de manguera C-80 de media pulgada, 1 conector espiga de ½ pulgada, niple espiga de ½ pulgada, 4 abrazaderas sin fin de ¾, cinta teflón de ¾, tapon galvanizado, cuerda exterior de ½, gas lp.



- cancelación de toma domiciliaria calle galeana de adrián Barahona (Javier Domínguez) col. tulipanes.

10 agosto 2018

- revisión de tomas en la calle mariano Escobedo 18 de marzo por compresoras, por no llegar presión de agua verificando y desconectando las tomas hasta la red general de 2 ½ pulgada, materiales: 2 niples de bronce de ½ pulgada, 6 abrazaderas sin fin de ¾ gas lp, cinta teflón de ¾, 1 metro de manguera cedula 80 de media pulgada.
- se repara fuga en la calle Abasolo en la col.18 de marzo siendo manguera averiada, materiales: 2 abrazaderas sin fin de ¾ y un niple espiga de bronce de ½ pulgada.

13 agosto 2018

Nuevo Teapa, Se coloca encamisado de 6 pulgadas de PVC rígido para la modificación de la red general de agua de 2" pulgadas de PVC hidráulico ocupando 3 tramos de tubería de 6 metros=18 metros.

14 agosto 2018

- se repara fuga en santa Cecilia en el área del 1er pozo modificando conexiones y colocando un tapón campana de 3" pulgadas de PVC.
- se cancela dos tomas domiciliarias por adeudo de servicio en la manguera C-80 de 1/2 pulgada, usuario Odón bautista calle Michoacán col. obrera y Oliverio Gonzales francisco montes de oca col. Comercial, material: conector cuerda exterior de ½ pulgada, 1 tapón cuerda interior de ½ pulgada y abrazadera sin fin de ¾.



15 agosto 2018

se transporte tripie de 3 pulgadas reforzado para la realizar trabajos en el pozo de tlaquilolapán por presentar falla en el flujo de agua, acondicionando el área para realizar los trabajos.

16 agosto 2018

- ❖ trabajos en el pozo de tlaquilolapán se desarma parte del tren y se desazolva de sedimento y se vuelve a conectar alineándolo a la red general quedando pendiente.
- ❖ reparación de fuga en el puente Ignacio Zaragoza 18 de marzo averiado por trabajos realizado por Conagua, materiales: conexión de fierro de 3 pulgadas bridada, codo 45° de fierro de 3" pulgadas, sellos garlock de 3" pulgadas, 2 coples de reparación de 3 pulgadas de PVC, tornillería de 5 octavos, alambre de amarre.

17 agosto 2018

Tlaquilolapán. - se baja 1 tramo de tubería al pozo por quedarse sin agua bomba, quedando en 13 tramos de tubería de 2 pulgadas más la bomba.

18 de agosto 2018

Se marca concreto hidráulico con cortadora en la calle Álvaro obregón y Benito Juárez de una modificación de un drenaje por encontrarse ensolvado.

20 agosto 2018

- Reconexión en trancas viejas a nombre. de Manuel Benítez Hernández Úrsulo Galván, material: 8 metros de manguera C-80 ½ pulgada, niple espiga de ½ pulgada, 4 abrazaderas sin fin ¾, bastón de ½ pulgada de cobre, 2 codos cuerda interior soldables, 65 cm de cobre de ½ pulgada, llave jardinera de ½ pulgada, 1 conector cuerda exterior espiga de ½ pulgada, gas lp, pasta silex y estaño, cinta teflon ¾.



- ❖ Reconexión en trancas viejas calle Úrsulo Galván esq. Cuitláhuac quedando pendiente la excavación, por no ubicar la red general por estar cancelada hasta la Hidrotoma.

- ❖ Se realiza toma domiciliaria en tlacuilolapán en la calle Chapultepec a nombre de la sr. Leonora morales, encontrándose realizada por concepto de pavimentación de la calle quedando un disparo para su conexión, material: niple espiga de ½ pulgada de bronce 6 metros de manguera C-80 de ½ pulgada ,6 abrazaderas sin fin de ¾, bastón de cobre de ½ pulgada, 2 codos cuerda interior soldable, llave jardinera de ½ pulgada, 65 cm tubería de cobre de ½ pulgada conector espiga de ½ pulgada, pasta silex estaño y gas lp, cinta teflón ¾.

21 agosto 2018

- revisión de tomas domiciliarias en la calle Álvaro obregón col. nueva esperanza por no llegarles el gua a nombre de la sr. Emma y margarita olan desconectando y sopletear con gas lp, en Cuichapa mol ver.

- tlacuilolapán revisión de toma domiciliaria por contrato de servicio siendo cruce de calle en miguel hidalgo de tlacuilolapán siendo más de 80 metros de manguera de la red general a su domicilio.

22 agosto 2018

Fuga en tlacuilolapán en la red general que va hacia el tanque de almacenamiento de 50 mil litros siendo un tapón de una terminación de línea de 3 pulgadas, colocando un tapón de campana de 3 pulgadas.



23 agosto 2018

Trabajos en el pozo 3^a1 y a32 cambiando bombas sumergibles, realizando los trabajos con la wincher.

3^a1:16 tramos de 4 pulgadas por 3 metros de longitud, bomba sumergible de 25 hp fondo del pozo 92.5 metros aproximadamente, nivel estático 22 metros, 48 metros de profundidad quedando la tubería y bomba.

3^a2:16 tramos de 4 pulgadas por 3 metros de longitud, bomba sumergible de 25 hp fondo del pozo 96 metros, 48 metros de profundidad más la bomba.

24 agosto 2018

se transporta tripie de fierro de 3 pulgadas de tubería reforzada de fierro del área del pozo de tlaquilolapán al pozo 3^a1 y 3^a2 para bajar dos tramos al pozo 3^a2 por quedarse sin agua.

27 agosto 2018

reconexión en trancas viejas en la calle Úrsulo Galván esq. cuitlahuac a nombre de carolina Segovia Segovia se realiza toma nueva por no encontrarse, materiales Hidrotoma de 2 pulgadas, 8 metros de manguera C-80 de ½, 3 abrazaderas sin fin ¾, 2 conectores cuerda exterior espiga de ½ pulgada, bastón de 1/2 pulgada de cobre, 2 codos cuerda interior soldable, 65 cm de tubería de cobre, 1 llave jardinera de ½ pulgada, pasta silex estaño, gas lp y cinta teflón ¾.



28 agosto 2018

trabajos realizados en el pozo 3^a2 colocación de 2 tramos de tubería de 4 pulgadas, con la ayuda de un tripie reforzado de 3 pulgadas y un diferencial con capacidad para tres toneladas quedando 3^a2 de la siguiente manera, bomba sumergible de 25 hp Altamira ,18 tramos de tubería de 4 pulgadas por 3 metros de longitud profundidad del pozo 92.5 metros.




29 agosto 2018

revisión de tomas domiciliarias en la calle Venustiano Carranza por compresora donde termina red general de 2 ½ por no llegar el agua, desconectando las tomas, se realiza excavación de 6 metros de longitud ocupando los sig. materiales 4 abrazaderas sin fin ¾ y 2 niples de bronce de ½ pulgada. se transporta tripi de 3 pulgadas del área del pozo 3^a1 de la bomba al pozo de nuevo Teapa.



30 agosto 2018


- realización de toma domiciliaria a nombre de la sr. Martha Elena torres Hernández calle 20 de julio col. obrera callejón carrillo puerto, materiales: Hidrotoma de 2 1/2 pulgada, 10 metros de manguera C-80 de 1/2 pulgada, 2 conectores cuerda exterior de espiga de 1/2 pulgada, 3 abrazaderas sin fin 3/4, tapón cuerda interior galvanizado de 1/2 pulgada, 1 tramos de tubería de 2 pulgadas de pvc para encamisar la manguera C80 de 1/2 pulgada.

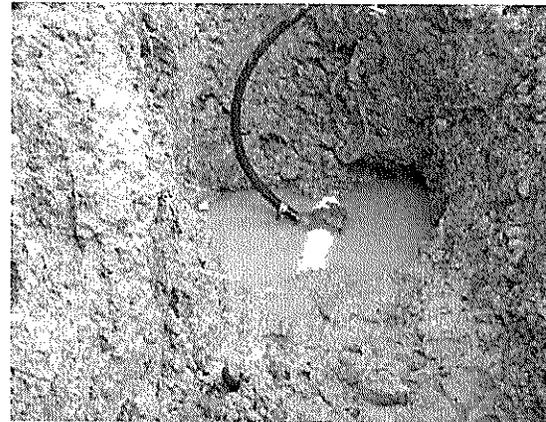

- reparación de fuga en la 1ero de mayo col. obrera, materiales: 2 coples de reparación de 2 1/2 pulgada, 2 metros de tubería de 2 1/2 pulgada.

31 agosto 2018

- Fuga en tlacuilolapán calle Ignacio Zaragoza, material Hidrotoma de 3 pulgadas, 2 abrazaderas sin fin 3/4, conector cuerda exterior espiga de 1/2 pulgada, cinta teflón de 3/4.
- Conexión de toma domiciliaria en santa Cecilia en la calle lázaro cárdenas a nombre de José Vázquez suriano, dejando disparo; material: 2 abrazaderas sin fin de 3/4, 2 codos cuerda interior soldables de 1/2 pulgada, 1 conector cuerda exterior espiga de 1/2 pulgada, llave jardinera de 1/2 pulgada, 65 cm tubería de cobre de 1/2 pulgada, pasta silex, gas lp, estaño y cinta teflón 3/4.

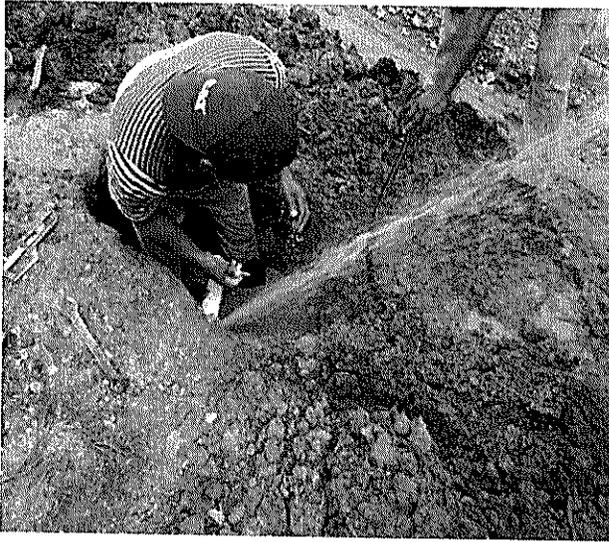

03 septiembre 2018

Reparación de fuga en el kilómetro 39, materiales: Hidrotoma de 2 pulgadas, 6 metros de manguera C80, Hidrotoma de 2 pulgadas y abrazadera sin fin $\frac{3}{4}$ y un bastón de $\frac{1}{2}$ pulgada.

04 septiembre 2018

Conexión de toma domiciliaria a nombre: sr. Laureano Iuria González, calle 20 julio col. obrera, material: Hidrotoma de 2 $\frac{1}{2}$ pulgada, 9 abrazaderas sin fin de $\frac{3}{4}$, 60 metros de manguera C-80, 2 codos cri soldables de $\frac{1}{2}$ pulgada, 65 cm de cobre de $\frac{1}{2}$ pulgada, llave jardinera de $\frac{1}{2}$ pulgada, 2 conectores cuerda exterior de $\frac{1}{2}$ pulgada, cinta teflón de $\frac{3}{4}$, pasta silex, estaño y gas lp.

05 septiembre 2018

- reparación de fuga en un bastón en la calle Francisco Sarabia col. la bomba material: codo de $\frac{1}{2}$ pulgada soldable de cobre pasta silex estaño y gas lp.



- reparación de fugas domiciliarias en la calle miguel hidalgo de la col. comercial por trabajos realizado en pavimentación, materiales: 20 metros de manguera cedula 80 de ½ pulgada, 30 niples de ½ pulgada de bronce, 40 abrazaderas sin fin de 3/4, 1 metros y 50 cm de tubería de cobre de ½ pulgada.

06 septiembre 2018

se realiza toma domiciliaria en la calle Zósimo Pérez col. ejidal rompiendo parte del concreto hidráulico quedando pendiente.

07 septiembre 2018

- terminación de la toma domiciliario col ejidal del día 06-09-2018 a nombre del sr. Josué Ramírez, materiales: 8 metros de manguera C80 de media pulgada, Hidrotoma de 2 ½ pulgada, 3 abrazaderas sin fin ¾, 2 conectores cuerda exterior de ½ pulgada, 65 cm de tubería de cobre de ½ pulgada, 2 codos cuerda interior soldable de ½ pulgada, llave jardinera de ½ pulgada, pasta silex estaño, gas lp, y cinta teflón de ¾.
- revisión de fuga en el salón de usos múltiples siendo el flotador de un tinaco.

08 septiembre 2018

limpieza y desazolve de drenaje en la calle Bernal diaz del castillo consistiendo en sopleteo, succión y extracción de sedimento col. lázaro cárdenas con maquinaria (bactor).

09 septiembre 2018

continua la limpieza y desazolve de drenaje en la calle Álvaro obregón esq. Benito Juárez, sopleteo, succión y extracción de sedimento con maquinaria (bactor).



10 septiembre 2018

limpieza y desazolve de drenajes en la col. ejidal calle Zósimo Pérez Luis Donald Colosio.

11 septiembre 2018

- fuga en la calle primero de mayo col. obrera material 1 metro de manguera C80 de media pulgada, 2 niples de bronce de $\frac{1}{2}$ pulgada de espiga, 4 abrazaderas sin fin de $\frac{3}{4}$, gas lp.
- reparación de fuga en san Lorenzo manguera averiada, material: niple espiga de $\frac{1}{2}$ pulgada de bronce, 2 abrazaderas sin fin de $\frac{3}{4}$ y gas lp.

12 septiembre 2018

- toma domiciliaria por no llegarle el agua sr. Jessica realizando trabajos hasta la Hidrotoma, material 5 abrazaderas sin fin $\frac{3}{4}$, 30 metros de manguera C-80 de $\frac{1}{2}$, 2 niples de espiga de $\frac{1}{2}$ pulgada, gas lp y cinta teflón $\frac{3}{4}$.
- cancelación de dos tomas domiciliaria por adeudo calle corregidora colonia aviación a nombre de: ángel huerta cancelada en Hidrotoma y marcial delgado. material: tapón cuerda exterior galvanizada de $\frac{1}{2}$ pulgada, conector cuerda interior de $\frac{1}{2}$ pulgada, 2 abrazadera sin fin de $\frac{3}{4}$.



13 septiembre 2018

Conexión de toma domiciliaria a nombre de patricia López Gómez calle Bernal diaz del castillo colonia lázaro cárdenas, se encontraba realizada cuando se pavimento la calle existiendo un disparo, materiales:15 metros de manguera C-80 de ½ pulgada,8 abrazaderas sin fin ¾, 1 bastón de ½ pulgada, 2 codos cuerda interior soldables, 65 cm de tubería de cobre de media, 1 llave jardinera de 9 pulgadas, 1 conector cuerda interior de media pulgada pasta silex, estaño, gas lp, cinta teflón de ¾.

Conexión y colocación de un bastón de ½ pulgada de una toma domiciliaria pendiente a nombre de Martha Elena Torres Hernández, material: niple de ½ pulgada de espiga, 3 abrazaderas sin fin de 3/4, 65 cm de tubo de cobre de ½ pulgada, 2 codos cuerda interior soldable de ½ pulgada, llave jardinera de ½ pulgada,1 conector de cuerda exterior de ½ pulgada para manguera, pasta silex, estaño, gas lp y cinta teflón de ¾.

Fuga en la calle Ignacio Zaragoza manguera averiada en una toma domiciliaria materiales: niples de ½ pulgada de bronce, 4 abrazaderas sin fin 3/4, 60 cm de manguera C-80 de ½ pulgada y gas lp.

14 septiembre 2018

reconexión en la calle Ignacio allende #24, material: 4 abrazaderas sin fin ¾, llave jardinera de ½, 65 cm tubería de cobre, 2 codos cuerda interior galvanizado, niple galvanizado 90 cm, cinta teflón ¾, niple espiga de ½ pulgada de bronce.



15 septiembre 2018

- reparación de fuga en la calle miguel hidalgo manguera averiada de $\frac{1}{2}$ pulgada, material: niple de espiga de $\frac{1}{2}$ pulgada y 2 abrazaderas sin fin de $\frac{3}{4}$.
- Revisión de flotador del salón de usos múltiples.

17 septiembre 2018

limpieza del área del pozo de la gasera 3e, se revisa la toma de adrián Barahona en la calle galeana encontrándose reconectada y procediendo a cancelar en la Hidrotoma, colocando un tapón cuerda exterior galvanizado de $\frac{1}{2}$ pulgada y tapando la excavación.

18 septiembre 2018

- Reparación de fuga en la calle mariano matamoros en la col. tulipanes materiales: 2 niples de espiga de $\frac{1}{2}$ pulgada, 4 abrazaderas sin fin $\frac{3}{4}$, 7 metro de manguera C-80 de $\frac{1}{2}$ pulgada y gas lp.
- se realiza conexión de Bernabé herrera diaz, calle Benito Juárez col. Cuichapa viejo, materiales: 2 conectores cuerda exterior de $\frac{1}{2}$ pulgada, 1 conector cuerda interior de $\frac{1}{2}$ pulgada, 3 abrazaderas sin fin $\frac{3}{4}$, 65 cm tubería de cobre de $\frac{1}{2}$ pulgada, 2 codos cuerda interior soldable de $\frac{1}{2}$ pulgada, llave jardinera de $\frac{1}{2}$ pulgada, pasta silex, gas lp, estaño, cinta teflón de $\frac{3}{4}$.



19 septiembre 2018

- reparación de fuga en una manguera en la calle miguel hidalgo col. comercial
- toma domiciliaria de mericia del Carmen Cornelio, material: 1 metro de manguera C-80 de $\frac{1}{2}$ pulgada, 4 abrazaderas sin fin de $\frac{3}{4}$, 2 niples espiga de $\frac{1}{2}$ pulgada y gas lp.
- levantamiento del censo de tomas domiciliaria en la calle miguel hidalgo

20 septiembre 2018

realización de toma domiciliaria en tlacuilolapán calle revolución, sr. Jorge Alberto Gómez Luis y margarita Córdoba García, materiales: hidrotoma de 3 pulgadas, 8 metros de manguera C-80 de $\frac{1}{2}$ pulgada, 2 conectores cuerda exterior de espiga de $\frac{1}{2}$ pulgada, 3 abrazaderas sin fin $\frac{3}{4}$, 65 cm de tubería de cobre de $\frac{1}{2}$ pulgada , 2 codos cuerda interior de media pulgada soldable, llave jardinera de $\frac{1}{2}$ pulgada, gas lp, pasta silex, estaño y cinta teflón $\frac{3}{4}$.

21 septiembre 2018

realización de toma domiciliaria en tlacuilolapán cancha de uso múltiples y kinder, materiales: hidrotoma de 2 1/2 pulgada, 6 metros de manguera C-80 de $\frac{1}{2}$, 2 conectores cuerda exterior de espiga de $\frac{1}{2}$ pulgada, 65 cm de tubería de cobre de $\frac{1}{2}$ pulgada, 2 codos cuerda interior de $\frac{1}{2}$ pulgada soldable, 1 llave jardinera de 1/2 pulgada, 3 abrazaderas sin fin $\frac{3}{4}$, cinta teflón $\frac{3}{4}$ gas lp, estaño y pasta silex.

Reparación de fuga en la calle miguel hidalgo col. comercial materiales: 6 niples espiga de bronce de $\frac{1}{2}$ pulgada, 12 abrazaderas sin fin de $\frac{3}{4}$ y 10 metros de manguera c80 de $\frac{1}{2}$.

Fuga en la miguel hidalgo Hidrotoma averiadas, materiales: 2 Hidrotoma de 2 $\frac{1}{2}$ pulgada, 2 niples espiga de $\frac{1}{2}$ pulgada, 2 conectores cuerda exterior espiga de $\frac{1}{2}$ pulgada, 6 abrazaderas sin fin $\frac{3}{4}$, cinta teflón de $\frac{3}{4}$ y gas lp.



22 septiembre 2018

Fuga en toma domiciliaria manguera y bastón de ½ pulgada averiada, materiales: niple espiga de ½ pulgada, 4 abrazaderas sin fin ¾, cople de ½ pulgada soldable, pasta silex, gas lp y estaño.

24 septiembre 2018

- reparación de manguera de 2 pulgadas para llenar la pipa en el pozo 3e de la gasera, material: 2 abrazaderas sin fin de 2 pulgadas y 3 metros de manguera de 2 pulgadas.
- trabajos realizados en la calle Benito Juárez col. Cuichapa viejo rompiendo la calle con maquinaria para toma domiciliaria nueva.

25 septiembre 2018

se comienza toma domiciliario en la calle Benito Juárez col. Cuichapa viejo. colocando encamisado de 2 pulgadas de PVC, para proteger la manguera de ½ pulgada cedula 80 de extremo a extremo de la calle.

26 septiembre 2018

- fuga en la agencia en el área de un baño llave jardinera averiada, material: llave jardinera de ½ pulgada y cinta teflón de ¾.
- traslado de tripie de 3 pulgadas reforzado del pozo de nuevo Teapa al área del pozo 3ª y 3ª2.
- Se extrae tubería en el pozo 3ª2 quedando pendiente.

27 septiembre 2018

reparación de fuga en la calle Bernal diaz del castillo rompiendo parte del concreto hidráulico, manguera averiada, materiales: 2 niples de espiga de 1/2 pulgada de bronce, 4 abrazaderas sin fin de ¾, 1 metro de manguera C80 de ½ pulgada y gas lp.
